
统一社会信用代码：91350629MA328E487Y

瀚蓝（漳州）固废处理有限公司

2021 年度企业环境信息披露报告

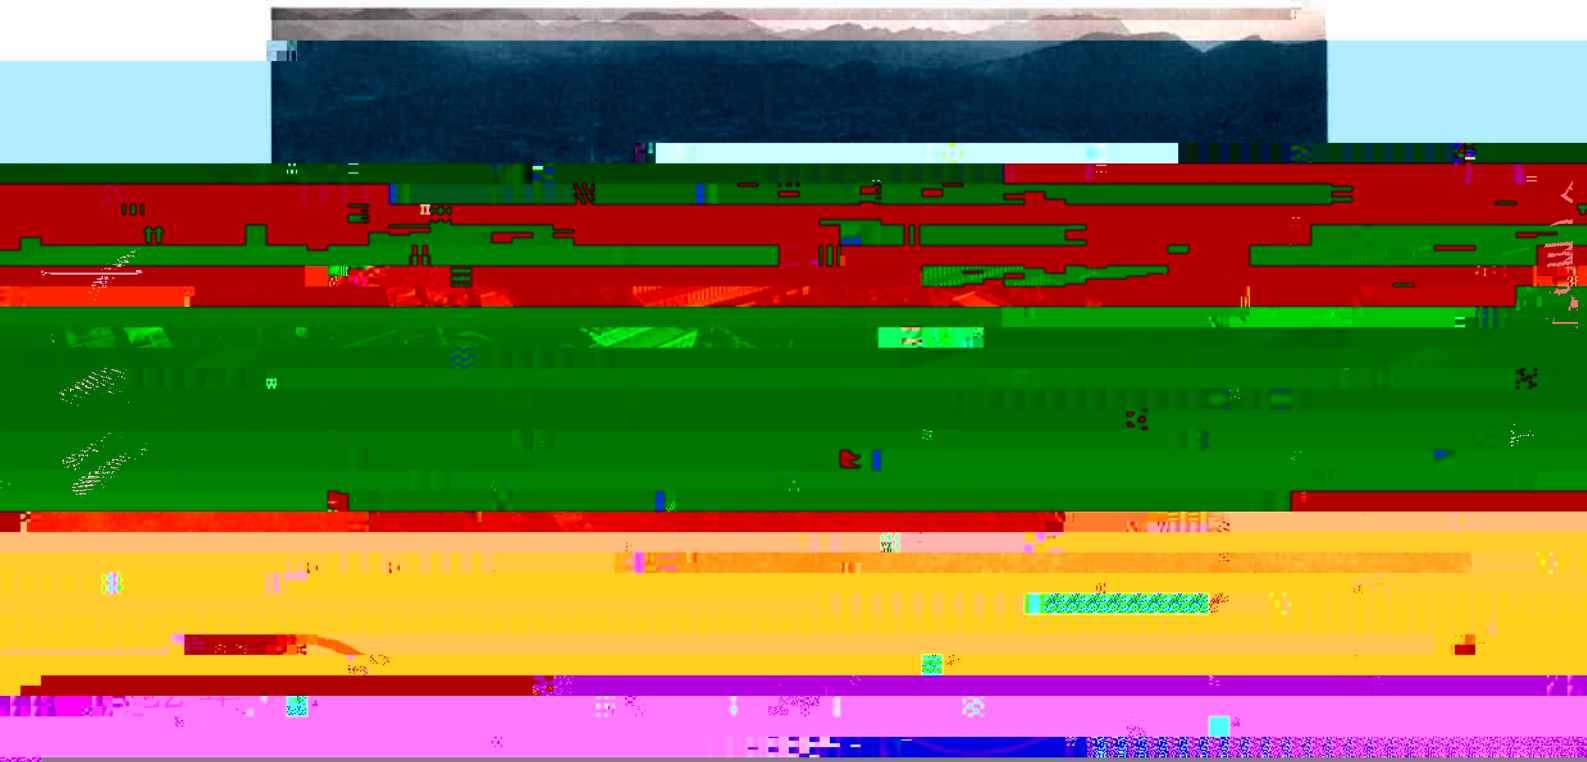

2

声　明

第一节　企业基本信息

一、基本情况

企业名称	[redacted]
统一社会信用代码	91350629MA328E487Y
[redacted]	韩立贺
[redacted]	180,000,000.00元
[redacted]	瀚蓝环境
[redacted]	600323
联系人	肖楚雄
电话	0596-7263399
传真	0596-7263399
电子邮箱	xiaochuxiong@grandblue.cn
公司网址	www.grandblue.cn
邮政编码	363801
信息公开平台	https://info.nhgre.com/channels/273.html

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否
主要产品与服务	固体废弃物治理；城市垃圾处理服务；城市垃圾清运服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；危险废物治理；其他	否
生产工艺		否
企业情况	正常经营	否

第二节　企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
发电厂环境影响评价	文件编号	漳环审〔2019〕12 号
	文件名称	漳州市生态环境局关于批复瀚蓝（漳州）固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的函
	核发机关	漳州市生态环境局
	批复日期	2019 年 10 月 31 日
配套飞灰填埋场	文件编号	漳华环审〔2020〕32 号
	文件名称	漳州市华安生态环境局关于瀚蓝漳州固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场项目环境影响报告书的批复
	批复日期	2020 年 7 月 20 日
[illegible]	文件编号	漳华环审〔2020〕51 号
[illegible]	文件名称	漳州市华安生态环境局关于瀚蓝（漳州）固废处理有限公司华安瀚蓝（漳州）供水管道敷设项目环境影响报告书的批复
	核发机关	漳州市华安生态环境局
	批复日期	2020 年 9 月 15 日

	许可编号	91350629MA328E487Y001V
	[redacted]	[redacted]
	有效期	2020 年 11 月 05 日至 2023 年 11 月 04 日
环保验收	[redacted]	漳州北部片区垃圾焚烧发电项目（一期） [redacted]
	验收批复	[redacted]

二、环境保护税缴纳信息

2021 年第一季度缴税情况	未投产
[redacted]	[redacted]
[redacted]	已按要求正常缴纳
[redacted]	已按要求正常缴纳

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险　　是☑　　否☐

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级　　优 ☐　　良 ☑　　一般 ☐　　差 ☐

第三节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

（一）防治设施信息

序号	污染防治设施			对应产污环节	污染物种	排放口编号	排放口名称	排放形式
	污染防							
	TA001	脱酸系统	半干法,干法	焚烧炉	氯化氢			
2	TA002	重金属控制	活性炭喷射,袋式除尘器	焚烧炉	汞及其化合物,锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物,镉铊及其化合物	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
3	TA003	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	焚烧炉	一氧化碳	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
4	TA004	除尘系统	袋式除尘器	焚烧炉	颗粒物	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
5	TA005	脱酸系统	半干法,干法	焚烧炉	二氧化硫	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
6	TA006	二噁英控制	“3T+E”燃烧控制,活性炭喷射,袋式除尘器	焚烧炉	二噁英类			

7	TA007	脱硝系统	SNCR PNCR	焚烧炉	氮氧	DA001	#1 焚烧线	有组
8	TA008	脱酸系统	半干法 干法	焚烧炉	氢、二氧			
9	TA009	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	焚烧炉				
					氯化	DA002	#2 焚烧线排气筒	有组织
10	TA010	重金属控制	活性炭喷射，袋式除尘器	焚烧炉	化硫 一氧化碳	DA002 DA002	#2 焚烧线 #2 焚烧线排气筒	有组 有组织
12					汞及其化合物，锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物，镉铊及其			
13	TA013	二噁英控制	“3T+E”燃烧控制,活性炭喷射,袋式除尘器	焚烧炉	二噁英类			
14	TA014	无组织排放控制措施	密闭，入炉焚烧	渗滤液处理站	甲硫醇，硫化氢，氨	/	/	/
						/	/	/
16							/	/

17			袋式除尘器	活性炭	颗粒				
18					氨，	/	/	/	
19	TA019	混除渣	除尘系统	炉渣池		/	/	/	
20						/	/		
21	TA021						/	/	
22						/	/		
23						/	/	/	
		无组织管控	负压，密闭，						
24						/	/	/	
					氨				
26	TA026					/	/	/	
27	TW001				氨 颗粒物	/	/		不外排
	TA020	袋式除尘器,密闭	除尘系统	水泥仓	颗粒物	/			
		袋式除尘		脱酸中	颗粒				

28	TW002	垃圾渗滤液处理系统	厌氧,预处理,+MBR 生化处理系统+纳滤+RO+浓液再浓缩	垃圾渗滤液	化学需氧量,氨氮,总磷,pH 值,五日生化需氧量,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,六价铬	/	/	不外排
29	TW003	生活污水处理系统	三级化粪池	水 生活污	需氧量,总氮,氨氮,总磷,五日生化需氧量,悬浮	DW001	生活污水排放口	进入城市污水处理厂

（二）非正常运行设施

1	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、	1	2021 年 10	34min	石灰制浆系
2	1#焚烧炉		1		49min	
		HCL、颗粒物		月 17 日		统故障
3	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、	1	2021 年 11		辅助燃烧器
		HCL、颗粒物		月 10 日		故障

4	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2021 年 12 月 17 日	60min	二次风机变频器故障
5	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2021 年 12 月 22 日	60min	干法给料系统故障
6	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、	1	2021 年 12	60min	炉膛掉焦
7	1#焚烧炉		1		60min	停

（三）运维信息

污染防治设施名称	运维单位
#2 炉焚烧炉 CEMS	厦门浪涛机电有限公司

（一）有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均值
1	DA001	#1 焚烧线排气筒	二氧化硫	7.621t	16.712 mg/m^3
2	DA002	#2 焚烧线排气筒			14.703 mg/m^3
3	DA001	#1 焚烧线排气筒	氮氧化物	64.608t	137.321 mg/m^3
4	DA002	#2 焚烧线排气筒			127.269 mg/m^3
5	DA001	#1 焚烧线排气筒	颗粒物	0.433t	0.912 mg/m^3
6					

（二）无组织废气

序号	日期	监测点位	污染物种类	排放浓度
		发电厂南侧		ND
1	2021 年 7 月 30 日	发电厂西侧	总悬浮颗粒物	0.09mg/Nm^3
		发电厂北侧		0.08mg/Nm^3
		发电厂东侧		0.09mg/Nm^3
		发电厂南侧		0.020mg/Nm^3
		发电厂西侧		0.037mg/Nm^3
2	2021 年 7 月 30 日	发电厂北侧	氨	[illegible]
		发电厂东侧		[illegible]
		发电厂南侧		[illegible]
		发电厂西侧		
3	2021 年 7 月 30 日	发电厂北侧	硫化氢	0.035mg/Nm^3
		发电厂东侧		0.002mg/Nm^3
		发电厂南侧		＜10
		发电厂西侧		＜10
4	2021 年 7 月 30 日	发电厂北侧	臭气浓度	＜10
		发电厂东侧		＜10
		发电厂南侧		ND
		发电厂西侧		[illegible]
5	2021 年 10 月 11 日	发电厂北侧	总悬浮颗粒物	ND
		发电厂东侧		ND

6	2021 年 10 月 11 日	发电厂南侧	氨	0.008mg/Nm^3
		发电厂西侧		0.009mg/Nm^3
		发电厂北侧		0.007mg/Nm^3
		发电厂东侧		0.007mg/Nm^3
7	2021 年 10 月 11 日	发电厂南侧	硫化氢	0.005mg/Nm^3
		发电厂西侧		0.007mg/Nm^3
		发电厂北侧		[illegible]
		发电厂东侧		[illegible]
8	2021 年 10 月 11 日	发电厂南侧	臭气浓度	12
		发电厂西侧		12
		发电厂北侧		13
		发电厂东侧		12
9	2021 年 12 月 17 日	发电厂南侧	总悬浮颗粒物	0.111mg/Nm^3
		发电厂西侧		0.165mg/Nm^3
		发电厂北侧		0.166mg/Nm^3
		发电厂东侧		0.219mg/Nm^3
10	2021 年 12 月 17 日	发电厂南侧	氨	0.01mg/Nm^3
		发电厂西侧		0.03mg/Nm^3
		发电厂北侧		0.02mg/Nm^3
		发电厂东侧		0.03mg/Nm^3
11	2021 年 12 月 17 日	发电厂南侧	硫化氢	0.001mg/Nm^3
		发电厂西侧		0.002mg/Nm^3
		发电厂北侧		0.001mg/Nm^3
		发电厂东侧		0.002mg/Nm^3

12	2021 年 12 月 17 日	发电厂南侧	臭气浓度	＜10
		发电厂西侧		＜10
		发电厂北侧		＜10
		发电厂东侧		＜10
		填埋场 WA#		0.016mg/Nm^3
13	2021 年 08 月 23 日	填埋场 WB#	氨	0.023mg/Nm^3
		填埋场 WC#		0.020mg/Nm^3
		填埋场 WA#		0.002mg/Nm^3
14	2021 年 08 月 23 日	填埋场 WB#	硫化氢	0.004mg/Nm^3
		填埋场 WC#		0.004mg/Nm^3
		填埋场 WA#		<10
15	2021 年 08 月 23 日	填埋场 WB#	臭气浓度	<10
		填埋场 WC#		<10
		填埋场 WA#		ND
16	2021 年 08 月 23 日	填埋场 WB#	总悬浮颗粒物	ND
		填埋场 WC#		
		填埋场 WA#		0.24mg/Nm^3
17	2021 年 12 月 17 日	填埋场 WB#	氨	0.08mg/Nm^3
		填埋场 WC#		0.12mg/Nm^3
		填埋场 WA#		0.004mg/Nm^3
18	2021 年 12 月 17 日	填埋场 WB#	硫化氢	0.005mg/Nm^3
		填埋场 WC#		0.006mg/Nm^3

19	2021 年 12 月 17 日	填埋场 WA#	臭气浓度	<10
		填埋场 WB#		<10
		填埋场 WC#		<10
		填埋场 WA#		0.056mg/Nm^3
20	2021 年 12 月 17 日	填埋场 WB#	总悬浮颗粒物	0.130mg/Nm^3
		填埋场 WC#		0.263mg/Nm^3

（三）自行监测情况

序号	监测情况	有组织废气
1	全年生产天数	162
2	自行监测是否达标	均达标

[redacted]

序号	监测情况	无组织废气
1	全年生产天数	162
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及第三方检测单位	发电厂厂界：臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢； 飞灰填埋场厂界：臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢； 检测单位：厦门华测检测技术有限公司。

三、水污染物排放信息

（一）水污染排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均浓度的年平均值
1	DW001	生活污水排放口	化学需氧量,总氮（以 N 计）,氨氮（NH_3-N）,总磷（以 P 计）,五日生化需氧量,悬浮物,色度	/	/
2	DW002	雨水排放口	/	/	/
3	DW003	堆场雨水		/	/

备注：本公司生产废水不外排

（二）自行监测情况

序号	监测情况	生活污水
1	全年生产天数	162
2	自行监测是否达标	均达标

（三）运维信息

[redacted]

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量（吨）	贮存量（吨）	处置方式	处置量（吨）
1	炉渣	SW03	36088.791	276.841	委托利用	35711.04

（二）一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	面积	经纬度坐标
1	渣池	贮存场所	275.1m²	东经：117.609800 北纬：24.659972

[redacted]

炉渣	漳州智鑫铭环保科技有限公司	[redacted]

（四）危险废物基本及排放信息



名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量	上一年贮存量	利用处置方式	利用处置量	本年度贮存量
生活垃圾				5017.44			4252.018	765.426
焚烧飞灰	772-002-18	重金属	毒性	4 吨	0	填埋	吨	吨
废矿物油		不饱和	易燃				0	0
							0	0
				0	0		0	0

（五）危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积	贮存设施污染防治信息
1	飞灰暂存库	1050.00 平方米	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存
2	危废暂存库	118.56 平方米	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存

（六）危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
生活垃圾焚烧飞灰	瀚蓝（漳州）固废处理有限公司飞灰填埋场	填埋
废石棉	福建兴业东江环保科技有限公司	填埋
废布袋	福建兴业东江环保科技有限公司	填埋

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限制	执行标准
2021.10.11	发电厂厂界噪声（白昼）	监测点 1#	厂界南侧	56.0	≤65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		监测点 2#	厂界东侧	55.6		
		监测点 3#	厂界北侧	57.0		
		监测点 4#	厂界西侧 1	56.6		
		监测点 5#	厂界西侧 2	56.8		
2021.11.18	发电厂厂界噪声（白昼）	监测点 1#	厂界南侧	52.8	≤60	GB12348-2008 3 类标准
		监测点 2#	厂界东侧	52.3		

	填埋场厂界噪声（夜间）	Z1	厂界东侧	43.9	≤50	8 2类标准
		Z2	厂界南侧	40.9		
		Z3	厂界西侧	40.1		
		Z4	厂界北侧	39.8		
2021.11.19	填埋场厂界噪声（白昼）	Z1	厂界东侧	46.7	≤60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准
		Z2	厂界南侧	43.8		
		Z3	厂界西侧	43.9		
		Z4	厂界北侧	44.0		
	填埋场厂界噪声（夜间）	Z1	厂界东侧	41.5	≤50	
		Z2	厂界南侧	39.4		
		Z3	厂界西侧	38.6		
		Z4	厂界北侧	39.4		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2021.11.17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	≤60	[redacted]

六、有毒有害物质

序号	名称	形态	危害类型	排放浓度	排放总量
1	生活垃圾焚烧飞灰	固态	毒性	/	4252.018t
2	废矿物油及含油废物	液态/固态	毒性、易燃性	/	2.92t

[redacted]

1、垃圾池、卸料平台采取封闭措施，抑制扬尘污染；

[redacted]

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告应编制的次数	4
2	实际编制的次数	4
3	发布信息	已在全国排污许可证信息管理平台发布排污许可证执行报告

第四节　碳排放信息

瀚蓝（漳州）固废处理有限公司 2021 年度未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第五节　强制性清洁生产审核信息

[redacted]

第六节　生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	漳州市华安生态环境局
2	备案编号	350629-2022-002-L
3	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第七节　生态环境违法信息

瀚蓝（漳州）固废处理有限公司无生态环境行政处罚信息。

第八节　本年度临时报告情况

[redacted]

[redacted]

瀚蓝（漳州）固废处理有限公司无相关投融资的生态环保信息。

第十节　总结

[redacted]

长(3 人)及委员(25 人)，配套建设有烟气净化车间、飞灰固化车间、污水处理站和飞灰填埋

[redacted]

放量。

[redacted]

第十一节　备查材料

1. 营业执照；

2. 排污许可证；

3. 漳州市生态环境局关于批复瀚蓝（漳州）固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的函；

4. 漳州市华安生态环境局关于瀚蓝漳州固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场项目环境影响报告书的批复；

5. 漳州市华安生态环境局关于瀚蓝（漳州）固废处理有限公司华安瀚蓝（漳州）供水管道敷设项目环境影响报告书的批复；

[redacted]

保验收报告；

7. 瀚蓝（漳州）固废处理有限公司华安瀚蓝（漳州）供水管道敷设项目竣工环保验收报告；

8. 财产和行为税纳税申报表；

9. 环境污染责任险保单；

10. 排污许可执行报告；

11. 自行监测年度报告；

12. 全年自行监测报告；

13. 危险废物处置委托合同；

14. 飞灰转运和填埋委托合同。
